

INFORME CONSOLIDADO CATCH & GO

Entrega 2

Taller Aplicado de Programación _ 002V — TPY1101

Campo	Detalle
Proyecto	Catch & Go — Plataforma de intermediación laboral temporal en Chile
Repositorio	https://github.com/ProgramacionDuoc26/Catch-Go.git
Periodo de planificación	16 de Marzo al 8 de Junio de 2026
Entrega 2	19 de mayo de 2026 — MVP funcional en nube / ambiente demo
Hito QA y mejoras	8 de junio de 2026 — testing, seguridad y mejoras finales
Equipo	Nicolás Iturrieta Villalobos · Marco Tassara Carrasco · Miguel Arredondo Vargas

INDICE

Contenido

INDICE	2
1 INTRODUCCION	3
2 EQUIPO DE TRABAJO	3
3 CONTEXTO, PROBLEMÁTICA Y OPORTUNIDAD	4
4 OBJETIVOS, ALCANCE Y ENTREGABLES DEL MVP	4
5 DOCUMENTACIÓN SOLICITADA	5
6 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES.....	6
7 DISEÑO DE SOLUCIÓN: UML, WIREFRAMES, MER, GANTT Y ARQUITECTURA	7
8 STACK TECNOLÓGICO	8
9 METODOLOGÍA SCRUM Y PLANIFICACIÓN.....	8
10 CARTA GANTT (16 MARZO AL 8 JUNIO 2026).....	9
11 VALORIZACIÓN DEL PROYECTO EN CHILE	10
12 MODELO DE NEGOCIO	11
13 FACTORES PARA EVALUAR EL PROYECTO	12
14 PLAN DE PRUEBAS Y CALIDAD	12
15 RIESGOS, SUPUESTOS Y RESTRICCIONES	13
16 EMPRESAS REFERENTES Y APRENDISAJES	13
17. CONDICIONES PARA EL ÉXITO FINAL	14
18. CONCLUSIÓN	14
19 FUENTES Y ANEXOS	15

1 INTRODUCCION

Catch & Go es una plataforma digital de intermediación laboral temporal orientada al mercado chileno. Su propósito es conectar empresas que necesitan cubrir turnos o labores puntuales con trabajadores disponibles que buscan ingresos flexibles y oportunidades cercanas a su ubicación.

El proyecto se presenta como un MVP académico desarrollado por tres integrantes, con dedicación parcial y foco en entregar una solución funcional, demostrable y documentada. La solución considera tres canales técnicos: backend con microservicios Java/Spring Boot, aplicación web en Next.js/TypeScript y aplicación móvil Android nativa en Kotlin/Jetpack Compose.

El informe consolida los contenidos de la Entrega 1 corregida, la documentación solicitada por la asignatura, la Carta Gantt realista, la valorización económica, el modelo de negocio referencial, los factores de evaluación del proyecto y los aprendizajes de empresas similares que han escalado en mercados de trabajo temporal, tareas por demanda o gestión de personas.

2 EQUIPO DE TRABAJO

Integrante	Rol principal	Responsabilidades reales en el proyecto
Nicolás Iturrieta Villalobos	Arquitecto / Product Owner / Backend	Coordinación del alcance, arquitectura técnica, backend, integración, matching inicial y validación de entregables.
Marco Tassara Carrasco	Scrum Master / QA / Android app	Gestión de sprints, pruebas, documentación QA, desarrollo Android, capa de red, login y apoyo Spring Boot.
Miguel Arredondo Vargas	Fullstack / Base de Datos / Frontend	Diseño de base de datos, frontend web, apoyo backend, persistencia, MER y documentación técnica.

3 CONTEXTO, PROBLEMÁTICA Y OPORTUNIDAD.

El mercado laboral chileno presenta una brecha entre empresas que requieren cubrir necesidades operativas de forma rápida y trabajadores que buscan ingresos ocasionales, part-time o por turnos. Sectores como retail, gastronomía, eventos, logística y servicios operativos suelen necesitar personal con poco tiempo de anticipación, mientras que los portales tradicionales de empleo están diseñados para procesos más largos.

La oportunidad de Catch & Go está en reducir el tiempo de búsqueda y postulación, ordenar la información del trabajador y la empresa, incorporar geolocalización, reputación y un motor de matching automatizado. En esta etapa se declara como motor de scoring basado en reglas y no como modelo de Machine Learning entrenado con dataset productivo, para mantener coherencia con el avance real del repositorio y el alcance académico.

Causa detectada	Efecto en el negocio	Respuesta propuesta por Catch & Go
Reclutamiento manual por WhatsApp, llamadas o redes sociales	Demoras, desorden y baja trazabilidad	Publicación digital de ofertas y postulaciones registradas.
Falta de reputación verificable	Desconfianza entre empresa y trabajador	Perfil, evaluación post-servicio y ranking bidireccional.
Ofertas sin proximidad geográfica	Mayor ausentismo y baja respuesta	Registro de coordenadas y filtros por ubicación.
Procesos tradicionales lentos	Turnos sin cubrir y pérdida operacional	Matching automatizado y dashboard por rol.

4 OBJETIVOS, ALCANCE Y ENTREGABLES DEL MVP

4.1 OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una plataforma web y móvil para conectar trabajadores y empresas en trabajos temporales, usando una arquitectura modular con microservicios Spring Boot, frontend web en Next.js y aplicación Android en Kotlin, integrando autenticación, perfiles, ofertas, postulaciones y matching automatizado como base del MVP académico.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Implementar un backend modular con api-gateway, auth-service, profile-service, jobs-service y matching-service.
- Crear una aplicación web con flujos diferenciados para trabajador, empresa y administración.
- Crear una aplicación Android con diseño visual, login, capa de red, sesión local y pantallas base.
- Desplegar un ambiente demostrable en nube o cloud académico, con variables de entorno y base de datos controlada.
- Ejecutar un plan de pruebas que incluya backend, frontend, Android, seguridad básica y validación del entorno.

4.3 ENTREGABLE DEL MVP

Módulo	Descripción	Estado esperado al 19 de mayo	Prioridad
Autenticación	Registro, login, JWT y control de sesión	Demo funcional con datos de prueba	Alta
Perfiles	Trabajador/empresa, datos base, habilidades, ubicación y rating inicial	CRUD básico y visualización	Alta
Ofertas laborales	Crear, listar, editar y consultar ofertas temporales georreferenciadas	Flujo demostrable web/backend	Alta
Postulaciones	Trabajador postula y empresa revisa candidatos	Tracking base	Alta
Matching automatizado	Scoring por habilidades, distancia, disponibilidad y reputación	Algoritmo inicial documentado	Alta
App web	Dashboards trabajador/empresa, ofertas, perfil, postulaciones	MVP navegable	Alta
App Android	Login, home, design system, red Retrofit y sesión local	MVP demostrable	Media-Alta
Cloud/demo	Frontend, backend y BD desplegados o ambiente cloud de pruebas	Smoke test y evidencias	Alta

5 DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

Document o solicitado	Contenido requerido	Estado / propuesta para Catch & Go	Ubicación sugerida
Informe	Contexto, problema, objetivos, alcance, arquitectura, metodología, planificación y calidad	Cubierto en este informe consolidado	Documentacion/Informe/
UML	Casos de uso, clases, actividad, secuencia y componentes	Se documentan diagramas base y se recomienda mantenerlos en Draw.io/Lucid	Documentacion/UML/
WireFrame / Mockup	Flujos visuales web y Android para trabajador/empresa	Mockups Figma y pantallas implementadas en web/Android	Documentacion/Mockup/
MER / Modelo de datos	Entidades, relaciones, claves y migraciones	Modelo conceptual + migraciones Flyway/Prisma	Documentacion/MER/ y Producto/backend/db/migration/

Gantt	Planificación por fechas, responsables y estados	Carta Gantt 16 marzo–8 junio 2026 incluida y valorizada	Documentacion/Diagrama_CartaGantt /
QA / Plan de pruebas	Casos de prueba, criterios de aceptación, evidencia y resultados	Matriz QA por tipo de prueba y responsable	Documentacion/QA/
Repositorio	Código fuente, scripts, librerías, README y ramas	GitHub ProgramacionDuoc26/Catch-Go	Producto/ y Gestión/

6 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES

6.1 REQUERIMIENTO FUNCIONALES

	Requerimiento	Módulo	Prioridad
RF-01	Registrar trabajadores y empresas con datos mínimos y rol definido.	auth-service / frontend / Android	Alta
RF-02	Iniciar sesión con token JWT y persistir sesión en web/Android.	auth-service / common-jwt / DataStore	Alta
RF-03	Crear y mantener perfil de trabajador/empresa, habilidades, comuna, ubicación y rating.	profile-service	Alta
RF-04	Publicar ofertas temporales con rubro, horario, tarifa, ubicación y descripción.	jobs-service	Alta
RF-05	Postular a una oferta y permitir seguimiento del estado.	jobs-service / frontend	Alta
RF-06	Generar sugerencias de matching por scoring automatizado.	matching-service	Alta
RF-07	Mostrar dashboard diferenciado para trabajador y empresa.	frontend web	Alta
RF-08	Gestionar notificaciones y estados operativos básicos.	Redis / frontend	Media

6.2 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

Atributo	Indicador	Mecanismo propuesto
Seguridad	Accesos protegidos y datos sensibles controlados	JWT, HTTPS en nube, variables de entorno, CORS y checklist OWASP básico.
Mantenibilidad	Código separado por capas	Controller, Service, Repository, DTO, Mapper, Entity y librerías common.
Portabilidad	Ambiente reproducible	Docker Compose con PostgreSQL 15 y Redis 7.
Escalabilidad	Servicios independientes	Microservicios desacoplados y API Gateway.
Calidad	Pruebas por capa y evidencia	JUnit, Postman, pruebas manuales web, Espresso básico y matriz QA.
Usabilidad	Flujo simple para dos perfiles	Dashboards por rol y onboarding guiado.

7 DISEÑO DE SOLUCIÓN: UML, WIREFRAMES, MER, GANTT Y ARQUITECTURA

7.1 DIAGRAMAS UML

Diagrama	Contenido mínimo	Uso en defensa
Casos de uso	Actor Trabajador, Actor Empresa, Actor Admin; login, crear perfil, publicar oferta, postular, revisar candidatos, evaluar.	Explicar alcance funcional del MVP.
Clases	UserAccount, Profile, JobOffer, JobApplication, MatchSuggestion, Rating, Subscription.	Mostrar modelo lógico de dominio.
Secuencia	Login JWT; publicación de oferta; postulación; cálculo de match.	Demostrar interacción frontend/API/backend/BD.
Componentes	Web App, Android App, API Gateway, microservicios, PostgreSQL, Redis, Supabase/Vercel/Railway.	Defender arquitectura técnica.
Actividad/BPMN	Flujo As-Is manual y flujo To-Be digital con plataforma.	Demostrar mejora del proceso de negocio.

7.2 WIREFRAME / PANTALLAS MINIMAS

Perfil	Pantallas mínimas	Resultado esperado
Público	Landing, quienes somos, contacto, login, registro y selección de rol	Entender propuesta y entrar al sistema.
Trabajador	Dashboard, ofertas, detalle oferta, postular, postulaciones, perfil, ajustes	Encontrar y postular a trabajos cercanos.
Empresa	Dashboard, crear oferta, lista ofertas, candidatos, perfil empresa, suscripción	Publicar necesidades y seleccionar postulantes.
Android	Splash, login, home, ofertas, perfil, estado de postulación	Uso móvil para trabajador.

7.3 MER

Entidad	Campos clave	Relaciones
user_accounts	id, name, email, password_hash, role, phone, created_at	1:1 con profile; emite tokens JWT.
profiles	id, user_id, type, rut, skills, commune, latitude, longitude, rating, plan	Pertenece a user_account; se vincula con ofertas/postulaciones.
job_offers	id, company_profile_id, title, description, sector, price, schedule, latitude, longitude, status	Empresa publica múltiples ofertas.
job_applications	id, job_offer_id, worker_profile_id, status, applied_at	Trabajador postula a múltiples ofertas.
match_suggestions	id, job_offer_id, worker_profile_id, score, reason	Resultado del motor de scoring.
ratings	id, from_profile_id, to_profile_id, score, comment	Construye reputación bidireccional.
transactions/subscriptions	id, profile_id, plan, amount, status	Complementario para planes de empresa/trabajador.

8 STACK TECNOLÓGICO

Capa	Tecnología real	Evidencia / uso
Backend	Java 21, Spring Boot 3, Spring Cloud Gateway, Maven multi-módulo	api-gateway, auth-service, profile-service, jobs-service, matching-service.
Seguridad	Spring Security + JWT	common-security y common-jwt.
Persistencia	PostgreSQL 15, Spring Data JPA, Flyway	Migraciones db/migration/V*.sql por servicio.
Cache/eventos	Redis 7	Sesiones, notificaciones y apoyo a matching.
Frontend web	Next.js 14, React 18, TypeScript, Tailwind CSS	Dashboards, ofertas, candidatos, perfil, login/registro.
BaaS/ORM	Supabase + Prisma	Autenticación/BD complementaria y schema.prisma.
Android	Kotlin, Jetpack Compose, Hilt, Retrofit, OkHttp, DataStore	Design system, login, capa de red y sesión.
Infraestructura	Docker Compose, Railway, Vercel, Supabase	Entorno local y despliegue académico.
Repositorio	GitHub con GitFlow	main, develop, qa, release/v1.0 y feature/*.


9 METODOLOGÍA SCRUM Y PLANIFICACIÓN

El proyecto utiliza Scrum con ciclos cortos, revisión de incrementos y control de entregables. Al ser un equipo de tres integrantes, se recomienda trabajar con sprints de una semana, reuniones breves de seguimiento y una rama por funcionalidad.

Artefacto / rito	Aplicación en Catch & Go	Frecuencia
Product Backlog	Historias priorizadas: auth, perfiles, ofertas, matching, web, Android y QA.	Continuo
Sprint Backlog	Tareas semanales por integrante con evidencia esperada.	Semanal
Daily / seguimiento	Qué hice, qué haré, bloqueos; puede ser por WhatsApp/GitHub.	3 veces por semana o diario según carga
Sprint Review	Demostración al docente: software, evidencias, Postman y capturas.	Fin de sprint
Retrospective	Ajuste de alcance, deuda técnica, riesgos y mejoras.	Fin de sprint

10 CARTA GANTT (16 MARZO AL 8 JUNIO 2026)

La planificación considera un equipo académico de tres integrantes, dedicación parcial y un objetivo realista: llegar al 19 de mayo con una segunda entrega funcional en nube o ambiente demo, y cerrar al 8 de junio con pruebas, seguridad, correcciones y mejoras finales.

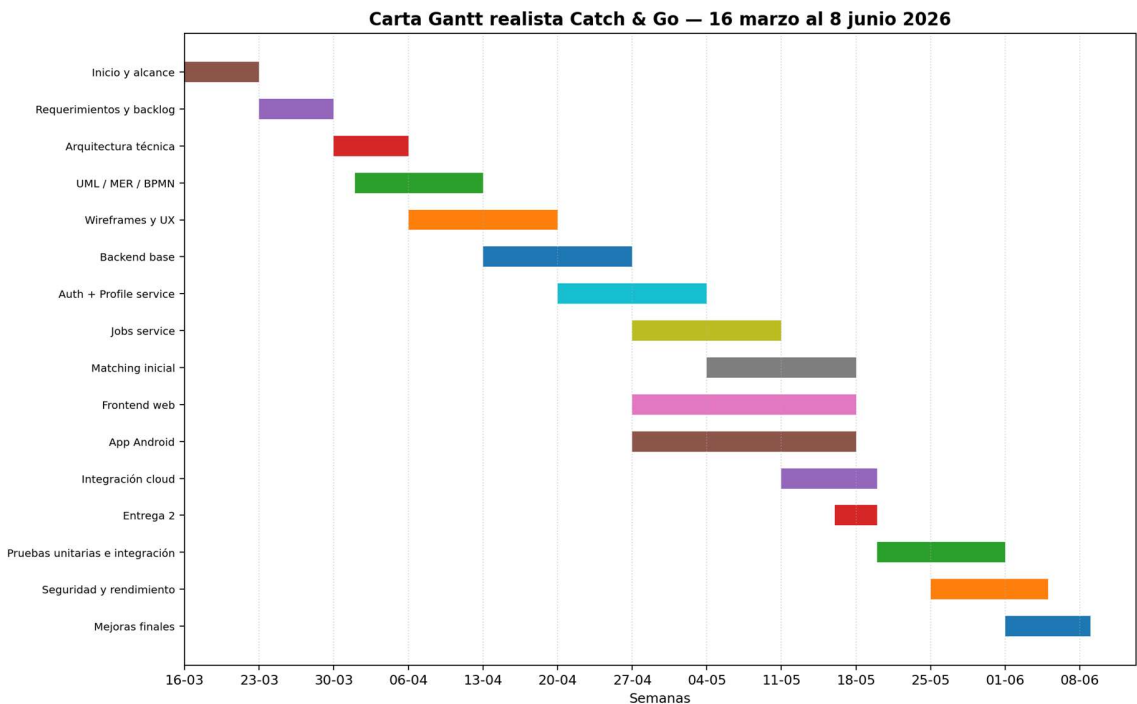

ID	Tarea	Inicio	Fin	Responsable	Horas	Costo valorizado	Estado
1	Inicio y alcance	16-03-2026	22-03-2026	Todo el equipo	32	\$298.000 CLP	Cerrado
2	Requerimientos y backlog	23-03-2026	29-03-2026	Nicolás	26	\$243.000 CLP	Cerrado
3	Arquitectura técnica	30-03-2026	05-04-2026	Nicolás	26	\$249.000 CLP	Cerrado
4	UML / MER / BPMN	01-04-2026	12-04-2026	Miguel + Marco	24	\$222.000 CLP	Cerrado
5	Wireframes y UX	06-04-2026	19-04-2026	Marco + Miguel	28	\$256.000 CLP	Cerrado
6	Backend base	13-04-2026	26-04-2026	Nicolás	34	\$331.000 CLP	Cerrado
7	Auth + Profile service	20-04-2026	03-05-2026	Nicolás + Miguel	34	\$328.000 CLP	Cerrado
8	Jobs service	27-04-2026	10-05-2026	Miguel + Nicolás	34	\$325.000 CLP	Cerrado
9	Matching inicial	04-05-2026	17-05-2026	Nicolás	34	\$319.000 CLP	Cerrado
10	Frontend web	27-04-2026	17-05-2026	Miguel + Nicolás	48	\$454.000 CLP	En desarrollo

11	App Android	27-04-2026	17-05-2026	Marco	40	\$350.000 CLP	En desarrollo
12	Integración cloud	11-05-2026	19-05-2026	Todo el equipo	30	\$280.000 CLP	Planificado
13	Entrega 2	16-05-2026	19-05-2026	Todo el equipo	24	\$224.000 CLP	Planificado
14	Pruebas unitarias e integración	20-05-2026	31-05-2026	Marco + Miguel	36	\$327.000 CLP	Planificado
15	Seguridad y rendimiento	25-05-2026	04-06-2026	Marco + Nicolás	28	\$257.000 CLP	Planificado
16	Mejoras finales	01-06-2026	08-06-2026	Todo el equipo	30	\$280.000 CLP	Planificado

Total valorizado del MVP educativo: 508 horas de trabajo académico/técnico, equivalente a \$4.743.000 CLP como costo de reposición referencial. Este monto no representa desembolso real, sino valorización del trabajo si se comprara en el mercado bajo tarifas junior/semisenior ajustadas a un contexto educacional.

11 VALORIZACIÓN DEL PROYECTO EN CHILE

Para evitar sobreestimar el proyecto, se separan dos miradas: valor educativo del MVP y valor de mercado si una empresa chilena tercerizara una solución similar. El equipo no incurre en remuneraciones reales, pero el trabajo posee valor económico por horas técnicas, herramientas, gestión, QA y despliegue.

Concepto	Criterio usado	Valor estimado
Horas del equipo	508 horas acumuladas entre tres integrantes, con tarifas académicas por rol entre \$8.500 y \$10.000 CLP/hora.	\$4.743.000 CLP
Cloud académico	Uso de Vercel Hobby, Supabase/Railway free trial o planes bajos; bajo tráfico de demostración.	\$0 a \$60.000 CLP/mes aprox.
Herramientas	GitHub, Figma/Draw.io/Lucid free o académico, Android Studio, VS Code, Docker.	\$0 a \$30.000 CLP/mes aprox.
Valor de mercado tercerizado	Equipo externo desarrollando web + backend + Android + BD + QA + despliegue.	\$18.000.000 a \$35.000.000 CLP
MVP educacional presentado	Costo real desembolsado bajo, pero con valor técnico documentado.	\$4.743.000 CLP referencial

11.1 SUPUESTOS DE COSTOS

Servicio	Uso en proyecto	Dato de mercado usado en el supuesto
Railway	Backend Spring Boot, PostgreSQL o servicios demo	Free trial inicial y plan Hobby con mínimo de uso de USD 5; Pro desde USD 20 mínimo de uso.
Vercel	Frontend Next.js	Hobby gratis para proyectos personales; Pro desde USD 20/mes + uso adicional.
Supabase	BD/BaaS complementario	Free tier para MVP y Pro referencial desde USD 25/mes + uso.
Google Maps Platform	Geocoding/Geolocation y mapas	Geocoding/Geolocation con free usage cap de 10.000 solicitudes y precio por 1.000 usos después del tramo gratuito.

12 MODELO DE NEGOCIO

El modelo de negocio se plantea como un marketplace laboral temporal. Para una etapa inicial se propone no depender de comisión por pago dentro de la plataforma, sino combinar planes de empresa, publicación destacada y, a futuro, una comisión transaccional cuando exista validación legal y operacional.

Año	Empresas activas	ARPA mensual	Jobs/emp/mes	Ticket prom.	Take rate	Ingresos totales	Costos operativos	Flujo neto
1	25	\$35.000 CLP	4	\$25.000 CLP	8%	\$12.900.000 CLP	\$3.900.000 CLP	\$6.570.000 CLP
2	60	\$40.000 CLP	6	\$27.000 CLP	8%	\$38.131.200 CLP	\$10.900.000 CLP	\$19.878.776 CLP
3	120	\$50.000 CLP	8	\$30.000 CLP	9%	\$103.104.000 CLP	\$23.700.000 CLP	\$57.964.920 CLP
4	200	\$60.000 CLP	10	\$32.000 CLP	9%	\$213.120.000 CLP	\$44.500.000 CLP	\$123.092.600 CLP
5	320	\$70.000 CLP	12	\$35.000 CLP	10%	\$430.080.000 CLP	\$76.500.000 CLP	\$258.113.400 CLP

La proyección es referencial y debe ser validada con empresas reales. Para defensa académica, se recomienda presentar este modelo como escenario conservador de validación y no como promesa financiera.

13 FACTORES PARA EVALUAR EL PROYECTO

La evaluación global ponderada del proyecto alcanza 3,834 sobre 5, equivalente a un desempeño medio-alto para un MVP educativo, con mejora prioritaria en normativa laboral, seguridad, pruebas e integración.

Factor	Peso	Puntaje	Ponderado	Riesgo	Acción de mejora
Factibilidad técnica	18%	4.2	0.756	Integración incompleta	Reducir alcance a auth + jobs + matching
Factibilidad operativa	15%	4.0	0.600	Baja adopción por complejidad	Onboarding guiado y pruebas con usuarios
Factibilidad económica	15%	3.8	0.570	Supuestos inflados	Validar precios con 5 empresas reales
Factibilidad legal/normativa	12%	3.2	0.384	Riesgo por relación laboral/contratos	Asesoría docente/legal y enfoque marketplace
Seguridad	12%	3.6	0.432	Exposición de credenciales/datos	Variables de entorno y no subir secretos
Calidad y pruebas	12%	3.7	0.444	Errores en defensa	Congelar alcance el 19 de mayo y testear
Escalabilidad	8%	4.0	0.320	Costos cloud suben	Monitoreo y límites de uso
Diferenciación/mercado	8%	4.1	0.328	No lograr masa crítica	Piloto acotado por comuna/rubro

14 PLAN DE PRUEBAS Y CALIDAD

Tipo de prueba	Objetivo	Herramienta	Responsable	Evidencia
Unitarias backend	Validar servicios, repositorios y lógica de negocio.	JUnit 5 / Mockito / Spring Boot Test	Marco + Miguel	Reporte de ejecución y capturas.
Integración API	Validar gateway y rutas /auth, /profiles, /jobs y /matching.	Postman / Swagger	Nicolás + Marco	Colección Postman y respuesta 200/401/400.
Base de datos	Verificar migraciones y backup/restore.	Flyway / pg_dump / pg_restore	Miguel	Script y log de restauración.
Frontend web	Validar login, registro, dashboards, ofertas y postulaciones.	Checklist manual / navegador	Nicolás + Miguel	Capturas y matriz de casos.
Android	Validar login, navegación, sesión local y consumo API.	Emulador / Logcat / Espresso básico	Marco	Capturas y logs.
Seguridad	Validar JWT, CORS, variables y rutas protegidas.	Postman + OWASP básico	Marco	Checklist de seguridad.
Smoke cloud	Comprobar que ambiente demo levanta y responde.	URL pública + healthcheck	Todo el equipo	URL, capturas y logs.

15 RIESGOS, SUPUESTOS Y RESTRICCIONES

Riesgo / supuesto	Impacto	Tratamiento recomendado
El equipo es de solo tres integrantes con dedicación parcial.	Sobrecarga y retrasos.	Congelar alcance el 19 de mayo; priorizar auth, perfiles, ofertas, matching y demo.
Ramas con funcionalidades no consolidadas.	La demo puede no reflejar todo el trabajo real.	Actualizar develop y qa; hacer PR por módulo desde feature/init-frontend.
Declarar Machine Learning sin modelo entrenado.	Observación docente por sobrealcance.	Presentar matching por scoring y roadmap de ML posterior.
Cloud free con límites.	Caídas o suspensión por uso/idle.	Mantener demo local con Docker como respaldo y controlar variables de entorno.
Datos personales y normativa laboral.	Riesgo legal si se escala sin control.	Términos, privacidad, consentimiento y asesoría antes de producción real.
Marketplace sin masa crítica.	Poca adopción inicial.	Piloto por comuna y rubro; validar con empresas reales.

16 EMPRESAS REFERENTES Y APRENDISAJES

Catch & Go se parece a empresas que combinan marketplace, gestión de trabajadores, reputación, geolocalización y operación. Ninguna debe copiarse directamente; sirven como referencia para definir qué condiciones aumentan la probabilidad de éxito.

Empresa	Similitud	Qué logró	Lección útil	Aplicación en Catch & Go
Job&Talent	Marketplace/gestión de personal temporal a gran escala	Cerró ronda con valoración aproximada de EUR 1.300 millones; uso de IA para reclutamiento y gestión laboral.	La IA agrega valor cuando resuelve reclutamiento real y medible.	Priorizar matching medible, validación de identidad, entrevistas o filtros y trazabilidad de contratación.
Airtasker	Marketplace horizontal de tareas y trabajos puntuales	Creció mediante comunidad, volumen transaccional y reputación entre usuarios.	La confianza y liquidez del marketplace importan más que muchas pantallas.	Partir con pocos rubros y una zona geográfica acotada para generar masa crítica.
Cornershop	Startup chilena de intermediación por app, geolocalización y operación local	Escaló desde Chile/México y fue adquirida por Uber; validó que la operación local es clave.	El software debe ir acompañado de procesos operativos, soporte y control de calidad.	Diseñar validación de empresas/trabajadores, soporte y seguimiento de cada trabajo.
Buk	SaaS chileno de RR.HH. con expansión regional	Creció desde Chile resolviendo gestión de personas y cumplimiento local.	Adaptarse a normativa y dolores reales de RR.HH. genera confianza empresarial.	Incluir trazabilidad, perfiles, reportes y cumplimiento de datos personales/laborales.

17. CONDICIONES PARA EL ÉXITO FINAL

- Partir con un nicho: no abordar todos los trabajos al inicio; elegir 1 o 2 rubros como logística/eventos/retail y una zona acotada de Santiago.
- Validar con clientes reales: entrevistar al menos 5 empresas y 10 trabajadores para ajustar campos, tarifas, dolores y flujo de contratación.
- Construir confianza: verificación de identidad, reputación, historial de trabajos, evidencias y soporte ante problemas.
- Medir KPI: tiempo para cubrir una oferta, tasa de postulación, tasa de aceptación, asistencia, rating promedio y recurrencia de empresas.
- Control legal: términos y condiciones, privacidad, consentimiento de datos, rol de intermediación y límites de responsabilidad laboral.
- Enfocar el MVP: entregar menos funcionalidades, pero integradas, probadas y defendibles técnicamente.
- Escalar después del piloto: solo incorporar pagos, IA avanzada o suscripciones cuando exista uso real y validación del mercado.

18. CONCLUSIÓN

Catch & Go es un proyecto viable a nivel académico y con una oportunidad de mercado clara, siempre que su alcance sea presentado de forma realista. El repositorio evidencia una base técnica sólida con microservicios, frontend web, Android, Docker, PostgreSQL, Redis y una estrategia GitFlow. Sin embargo, para la entrega se debe evitar sobredeclarar Machine Learning y posicionar el avance como un motor de matching automatizado por scoring, con evolución futura hacia ML cuando exista dataset real.

La Carta Gantt realista permite ordenar el trabajo desde el 16 de marzo hasta el 19 de mayo para la entrega funcional en nube, y desde el 20 de mayo hasta el 8 de junio para pruebas, seguridad y mejoras. La valorización educativa de \$4.743.000 CLP es coherente con 508 horas de trabajo de tres integrantes y permite justificar el valor del MVP sin inflar costos. Si el mismo producto se tercerizara en el mercado chileno, el rango razonable estaría entre \$18 y \$35 millones CLP, dependiendo del nivel de integración, QA, despliegue y soporte.

La enseñanza de referentes como Job&Talent, Airtasker, Cornershop y Buk es consistente: el éxito no depende solo del software, sino de resolver un dolor real, lograr confianza, generar masa crítica, validar con usuarios, medir resultados y adaptarse a la normativa local. Para Catch & Go, el camino recomendado es defender un MVP acotado, funcional, probado y con roadmap claro hacia piloto real.

19 FUENTES Y ANEXOS

Fuente	Dato utilizado	URL
Repositorio Catch & Go	Estructura, stack, ramas y alcance técnico	https://github.com/ProgramacionDuoc26/Catch-Go.git
Railway Pricing	Free trial, Hobby USD 5 mínimo de uso y Pro USD 20 mínimo de uso	https://railway.com/pricing
Vercel Pricing	Hobby gratis y Pro USD 20/mes + uso adicional	https://vercel.com/pricing
Supabase Pricing	Free tier y Pro referencial desde USD 25/mes + uso	https://supabase.com/pricing
Google Maps Platform Pricing	Geocoding/Geolocation con free usage cap de 10.000 y tarifa por 1.000 usos	https://developers.google.com/maps/billing-and-pricing/pricing
Cinco Días / El País	Job&Talent: ronda de EUR 92 millones y valoración EUR 1.300 millones	https://cincodias.elpais.com/companias/2025-04-10/jobtalent-cierra-una-ronda-de-92-millones-con-una-valoracion-de-1300-millones-y-da-entrada-a-blackrock.html
Excel entregado	Gantt, valorización, modelo de negocio, evaluación y referentes	Gantt Catch_and_go.xlsx
